

2022-110453

Lima, 03 de Mayo de 2022

Héctor Núñez del Prado Castro  
Gerencia de Proyectos  
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima, Lima

Asunto: Envío de convenio interinstitucional entre INVERMET y CALIDDA - Proyecto V. R. Haya de la Torre

Referencia: Carta N° 001193-2022-INVERMET-GP

De nuestra mayor consideración:

Me dirijo a usted, en atención al documento, de la referencia para remitirle el convenio interinstitucional entre INVERMET y CALIDDA - Proyecto V. R. Haya de la Torre firmado por parte de Cálidda.

Quedamos a su disposición para cualquier ampliación y/o aclaración que merezca la presente.

Atentamente,  
<25723776>

Ronald Limo Meiggs  
Coordinador de Integridad y Prevención de Daños

Adjunto:

1. Convenio interinstitucional entre INVERMET y CALIDDA - Proyecto V. R. Haya de la Torre firmado

CÁLIDDA  
C. Morelli 150  
C.C La Rambla, Torre 2,  
Teléfono: (51-1) 611-7500  
San Borja. Lima, Perú



**CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES – INVERMET Y LA EMPRESA GAS NATURAL LIMA Y CALLAO S.A. - CÁLIDDA**

Conste por el presente documento, el Convenio Interinstitucional, en adelante el "Convenio", que celebran, de una parte, **EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET**, con RUC N° 20164503080 y domicilio legal para estos efectos en Jr. Lampa N° 357, piso 5, distrito de Cercado de Lima, debidamente representado su Gerente de Proyectos, el señor **HÉCTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO**, identificado con DNI N° 40830948, designado mediante Resolución N° 007-2020-INVERMET-CD de fecha 16 de diciembre del año 2020 y en virtud de las facultades delegadas en el literal s) del numeral 2.2. del artículo 2 de la Resolución N° 000116-2021-INVERMET-GG, de fecha 30 de diciembre de 2021, a quien en adelante se le denominará **INVERMET**, y de la otra parte, la empresa **GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. – CÁLIDDA GAS NATURAL DEL PERÚ**, con RUC. N° 20503758114, con domicilio legal en Calle Morelli N° 150, Torre 2, Centro Comercial La Rambla, San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Director de Operaciones, el señor **EDWIN ALEXANDER VEGAS TORRES**, identificado con D.N.I. N° 02845609, cuyas facultades constan inscritas en la Partida Electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Oficina de Lima, a quien en adelante se le denominará **CÁLIDDA**, bajo los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA:      BASE LEGAL**

El presente Convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales

- 1.1. Constitución Política del Perú.
- 1.2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- 1.3. Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET.
- 1.4. Decreto Legislativo N° 295 que aprueba el Código Civil
- 1.5. Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.
- 1.6. Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.
- 1.7. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.8. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 1.9. Decreto Supremo N° 040-2008-EM, TUO Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.
- 1.10. Ordenanza N° 2315-2021, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.
- 1.11. Decreto de Alcaldía N° 002-2022, que aprueba el Manual de Operaciones del INVERMET.
- 1.12. Resolución N° 00042-2022-INVERMET-GG que aprueba la Directiva N° 002-2022-INVERMET-GG, denominada "Lineamientos para la gestión de Convenios de Cooperación Interinstitucional que suscriba el Fondo Metropolitano de Inversiones".

**CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES**

2.1 **INVERMET**, de conformidad con el Decreto Ley N° 22830, Ley que crea el Fondo Metropolitano de Inversiones, y el Reglamento de **INVERMET**, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con personería jurídica y autonomía administrativa, económica y técnica, tiene por objeto proporcionar recursos para el financiamiento del Programa de Inversiones y Obras Urbanas de la MML y de las Municipalidades Distritales, y se rige por las normas contenidas en su Ley de Creación, sus modificatorias, ampliatorias y conexas.

**EI INVERMET**, en cumplimiento de sus funciones, viene ejecutando la obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima- CIU 2388465”, en adelante la **OBRA PÚBLICA**.

2.2 Por su parte, **CÁLIDDA** es la empresa concesionaria del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos en el departamento de Lima, aprobado mediante Resolución Suprema N° 015-2002-EM.

2.3 **CÁLIDDA**, en virtud del Contrato de Concesión con el Estado Peruano, asumió la obligación de construir, instalar y operar el “Sistema de Distribución”, conforme dicho término es definido en el Contrato de Concesión, por un plazo de treinta y tres (33) años contados a partir del 9 de diciembre del 2000.

2.4 Con fecha 9 de diciembre del 2000, TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A. (“TGP”) y el Estado Peruano suscribieron el Contrato de Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao (según ha sido y puede ser modificado, el “Contrato de Concesión”).

2.5 Mediante Resolución Suprema No. 015-2002-EM se aprobó la cesión de posición contractual de TGP en el Contrato de Concesión a favor de **CÁLIDDA** y con fecha 2 de mayo de 2002, TGP, Suez-Tractebel S.A. y **CÁLIDDA**, con la intervención del Estado peruano, suscribieron el Convenio de Cesión de Posición Contractual del Contrato de Concesión. Como consecuencia de ello, **CÁLIDDA** sustituyó íntegramente a TGP en todos sus derechos y obligaciones bajo el Contrato de Concesión.

2.6 Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a **INVERMET** y a **CÁLIDDA** conjuntamente, se les denominará **LAS PARTES**.

**CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES**

3.1. La Gerencia de Proyectos de **INVERMET**, luego de efectuada las evaluaciones técnicas correspondientes ha detectado interferencias para la ejecución de la obra mencionada en el numeral anterior y que ameritan ser removidas a fin de lograr la continuación de la ejecución de la obra en mención.

3.2. Con Carta N° 2022-104049 del 04 de marzo de 2022, **CÁLIDDA** remitió el presupuesto para reubicación de redes, la reposición de cinta de seguridad, reubicación de postes, nivelación de válvulas, vigilancia técnica y costos adicionales por bioseguridad COVID 19 que asciende a S/ 233,809.50 (Doscientos treinta y tres mil ochocientos nueve con 50/100 Soles), y incluido el IGV y un cronograma de noventa (90) días calendario para la reubicación de redes en el área

de influencia del proyecto "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima- CIU 2388465".

- 3.3. Con Informe N° 029-2022-INVERMET-JISM, del 17 de marzo de 2022, la Gerencia de Proyectos a través de su Especialista, concluyó en otorgar la conformidad del presupuesto por un monto de S/ 233,809.50 (Doscientos treinta y tres mil ochocientos nueve con 50/100 Soles) y al cronograma de tres (03) meses y recomendó al Gerente de Proyectos iniciar el procedimiento de firma del convenio.
- 3.4. Con Memorando N° 000796-2022-INVERMET-GP, del 18 de marzo de 2022, el Gerente de Proyectos otorgo conformidad al presupuesto y al cronograma remitidos por **CÁLIDDA**; por lo que, concluyó que correspondería a INVERMET formalizar el acuerdo correspondiente, a fin de que se liberen las interferencias e INVERMET se haga cargo de desembolsar el monto correspondiente.
- 3.5. Con fecha 31 de marzo de 2022, se aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario N° 000000601 por S/ 233,809.50 (Doscientos treinta y tres mil ochocientos nueve con 50/100 Soles), para los trabajos de liberación de interferencia con CÁLIDDA para la liberación de interferencias de la obra "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima- CIU 2388465".
- 3.6. Mediante Memorando N° 000349-2022-INVERMET-OGPMP del 06 de abril de 2022, el Jefe Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto, hizo suyo el Informe N° 000031-2022-INVERMET-OGPMP-OPM; a través del cual se emitió opinión técnica favorable a la suscripción del Convenio para liberar interferencias en las obras "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima- CIU 2388465".

#### **CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO**

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la liberación de interferencias de infraestructuras de gas natural de propiedad de **CÁLIDDA** ubicadas en la zona de influencia, conforme al expediente técnico de la obra "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima- CIU 2388465", en adelante los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN**, cuyo costo y alcances ha sido detallado en el Presupuesto de fecha 04.03.2022, en adelante el **Presupuesto**, remitido por **CÁLIDDA** a través de la Carta N° 2022-104049, el cual forma parte integrante del presente convenio como **Anexo N° 1**.

#### **CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES**

5.1 **INVERMET**, se compromete a:

- 5.1.1. Asumir el costo total que implique los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN** citada en la Cláusula Cuarta del presente Convenio, de conformidad con el Presupuesto detallado en el **Anexo N° 01**; y en concordancia con la cláusula séptima.
- 5.1.2. Suscribir, previo al inicio de los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN**, un "Acta de inicio de trabajos", a través de la cual se establece la fecha de inicio de los

**TRABAJOS DE REUBICACIÓN**, a través del coordinador designado en el numeral 10.1. del presente Convenio.

- 5.1.3. Aprobar las modificaciones y/o ejecución de los trabajos adicionales a los presupuestados, siempre que resulten indispensables para cumplir con el objeto del Convenio, debiendo suscribirse la adenda respectiva, a efectos de efectuarse el pago correspondiente.
- 5.1.4 Gestionar y tramitar en forma oportuna y cuando corresponda las autorizaciones siguientes: (i) el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) ante el Ministerio de Cultura; (ii) el Instrumento de Gestión Ambiental ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; (iii) la gestión y tramitación para el Uso del Derecho de Vía; cualquier demora en la entrega de estas autorizaciones a **CÁLIDDA** por parte de INVERMET, significará la prórroga de los plazos, proporcional a los días de demora , sin responsabilidad alguna para **CÁLIDDA**.

5.2 **CÁLIDDA**, se compromete a:

- 5.2.1. Tramitar y obtener los permisos y/o autorizaciones municipales para la realización de los trabajos de reubicación, materia de Convenio.
- 5.2.2. Ejecutar los trabajos de reubicación de acuerdo al **PRESUPUESTO** y cronograma de obras señalados en los **Anexos N° 1 y N° 2** del presente Convenio, aprobados por **INVERMET**.
- 5.2.3. Presentar a **INVERMET** un Informe técnico final que contenga memoria descriptiva, liquidación técnico financiera del trabajo realizado y actas de inspección de la vigilancia realizada. Dicho informe técnico final será presentado dentro de los 45 días calendario de concluidos los trabajos de reubicación. El mismo que será aprobado por INVERMET en un plazo no mayor de 10 días calendarios.
- 5.2.4 Suscribir previo al inicio de los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN**, un “Acta de inicio de trabajos”, a través de la cual se establece la fecha de inicio de los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN**, a través del coordinador designado en el numeral 9.1. del presente Convenio.
- 5.2.5 Efectuar las entregas parciales a **INVERMET** de la liberación de interferencias en concordancia al avance de obra, previa coordinación expresa entre los coordinadores designados por **INVERMET** y **CÁLIDDA** en el numeral 10.1. del presente Convenio.

## **CLÁUSULA SEXTA: PLAZOS DE EJECUCIÓN**

- 6.1. El plazo de ejecución para los trabajos de reubicación de ~~redes~~ esredes es de 03 meses y se encuentra establecido en el cronograma de obra, el cual forma parte integrante del presente Convenio como **Anexo N° 2**. Los trabajos nivelación de Válvulas, reposición de Cinta, reubicación de postes y vigilancia preventiva se realizarán durante el tiempo de ejecución de la **OBRA PÚBLICA**.
- 6.2. Previo al inicio de los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN**, **LAS PARTES** suscriben un “Acta de inicio de trabajos”, a través de la cual se establece la fecha de inicio de los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN**.

- 6.3. Los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN**, conforme al **Cronograma de Obra**, se inician como máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del "Acta de inicio de trabajos" referida en el párrafo precedente; y solo se iniciarán siempre que **INVERMET** haya cancelado el costo total del **PRESUPUESTO** y que **CÁLIDDA** cuente con los permisos y autorizaciones de las entidades correspondientes.
- 6.4. En caso de producirse atrasos y/o paralizaciones en la ejecución de los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN**, por caso fortuito, fuerza mayor o causas ajenas a **CÁLIDDA**, dichos períodos serán agregados a los plazos establecidos en el **Cronograma de obra**, siendo que para ello **CÁLIDDA** deberá presentar la solicitud respectiva debidamente sustentada. No obstante, en caso de que los atrasos y/o paralizaciones sean por causas imputables a **INVERMET** y/o sus contratistas, los costos y gastos que se generen deberán ser asumidos por **INVERMET**.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN Y FORMA DE PAGO**

- 7.1 **EL INVERMET** se compromete a asumir el costo total de los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN** conforme al **PRESUPUESTO** emitido por **CÁLIDDA** y que ascienden a la suma total de S/ 233,809.50 (Doscientos treinta y tres mil ochocientos nueve con 50/100 Soles) y un cronograma de tres (03) meses calendario, en un (1) único desembolso, para cuyo efecto **CÁLIDDA**, en un plazo de cinco (5) días calendario posterior a la suscripción del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, debe remitir a **EL INVERMET** el comprobante de pago correspondiente. No obstante, las partes señalan que el costo total de la obra podrá ser ajustado en el marco del artículo 1776 del Código Civil peruano.

En este último supuesto, las partes se comprometen a realizar el reembolso y/o compensaciones por las variaciones que se pudieran presentar en la ejecución del presente proyecto, conforme se desprenda de la liquidación técnico financiera que será presentado en el marco de la cláusula 5, numeral 2.3 del presente convenio.

- 7.2 De verificarse que existe un reembolso o compensación a favor de alguna de las partes, este deberá realizarse en un plazo máximo de 20 días calendarios, luego de la conformidad del Informe técnico final de las partes, en el caso de **Invermet**, dicha conformidad estará a cargo de la Gerencia de Proyectos.
- 7.3 Dentro de los diez (10) días calendario posterior a la recepción de la factura emitida por **CÁLIDDA**, **INVERMET** debe efectuar el pago por el costo total previsto en el **PRESUPUESTO**, en la cuenta bancaria de **CÁLIDDA** que se indique para tal efecto.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL**

- 8.1 Los **TRABAJOS DE REUBICACIÓN** se realizan dentro del ámbito geográfico de la obra: "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima- CIU 2388465".
- 8.2 **CALIDDA** es el propietario de la Infraestructura del sistema de distribución de Gas Natural, el cual se encuentra ubicado en la zona de intervención del **PROYECTO**,

los cuáles será desmontados, retirados, reubicados e instalados en virtud del presente Convenio.

### **CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL CONVENIO**

- 9.1. El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de un (01) año calendario, contado a partir de la fecha de su suscripción.
- 9.2. El presente Convenio podrá ser prorrogado antes de su término, mediante acuerdo de **LAS PARTES** con una anticipación de diez (10) días calendario al término de la vigencia del Convenio.

### **CLÁUSULA DÉCIMA: COORDINADORES**

10.1. Para el logro del objeto del Convenio, **LAS PARTES** designan como sus coordinadores encargados de la ejecución, seguimiento y supervisión de todas las actividades que se deriven del presente Convenio, a los siguientes:

- a) Por **CÁLIDDA**: El Coordinador de Proyectos Ing. Hugo Ernesto Herrera Pamo, teléfono: 981411769, correo electrónico: [hugo.herrera@calidda.com.pe](mailto:hugo.herrera@calidda.com.pe)
- b) Por **INVERMET**: La Gerencia de Proyectos, a través del señor Julio Sabino Inga Moreno, teléfono: 935255973, correo electrónico [osgp144@invermet.gob.pe](mailto:osgp144@invermet.gob.pe)

10.2. Los Coordinadores son responsables del seguimiento a la ejecución del presente Convenio, debiendo informar a sus respectivas entidades sobre cualquier incidencia a efectos que se adopten las acciones que permitan facilitar su cumplimiento oportuno, en las condiciones, plazos y cronogramas que se hayan acordado, para lo cual podrán conformar equipos técnicos de trabajo. Asimismo, coordinarán la atención y, de ser el caso, solución a cualquier incidente que se suscite, dentro del marco del presente Convenio e informarán periódicamente a sus respectivas entidades sobre los resultados obtenidos en su ejecución.

10.3. Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado obligatoriamente a la otra parte por escrito, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente en que se dispuso el mencionado cambio.

### **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMUNICACIONES**

11.1. Toda comunicación que deba ser cursada entre **LAS PARTES** puede efectuarse de la siguiente manera:

- a) **Comunicación por medio físico.** La comunicación se entenderá válidamente realizada desde el momento en que el documento o comunicación notarial correspondiente sea entregado al domicilio del destinatario, el cual figura en la introducción del presente Convenio.
- b) **Comunicación por medio virtual.** La comunicación se entenderá válidamente realizada desde el momento en que el correo electrónico [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe) y los correos [mesadepartesvirtual@invermet.gob.pe](mailto:mesadepartesvirtual@invermet.gob.pe), [osgp144@invermet.gob.pe](mailto:osgp144@invermet.gob.pe), cursado entre quienes suscriben este Convenio, así como entre los coordinadores designados por **LAS PARTES**, sea recibido y confirmado por el destinatario.

11.2. Cabe señalar que **LAS PARTES** podrán efectuar ambas formas de comunicación u optar por una de las mismas conforme a lo preceptuado en esta cláusula.

## **CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES**

Toda modificación al presente Convenio se realiza dentro del plazo de su vigencia y a través de la suscripción de la adenda correspondiente bajo las mismas formalidades que dieron origen al presente convenio.

## **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD**

13.1 **LAS PARTES** son responsables de la ejecución del presente Convenio y sus compromisos son exigibles de acuerdo con los dispositivos legales vigentes.

13.2 **LAS PARTES** intervinientes dejan expresa constancia que en ningún caso tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor en el desarrollo y ejecución del presente Convenio.

13.3 **INVERMET** será responsable por las afectaciones ocasionadas por sus contratistas y/o subcontratistas a las instalaciones de gas natural, que se generen producto de la ejecución del “Proyecto” En este supuesto, **INVERMET** deberá asumir los costos, daños y perjuicios producto de la afectación. Para ello, **CÁLIDDA** emitirá una carta de notificación de daños a **INVERMET** para el que proceda con realizar el pago correspondiente de manera directa o a través de las Pólizas de responsabilidad civil.

13.4 **INVERMET** contratará o exigirá a sus contratistas la contratación de las pólizas de responsabilidad civil que cubran daños y perjuicios a terceros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la materia.

13.5 **INVERMET** se obliga a mantener indemne a **CÁLIDDA** frente a:

a) Cualquier daño o perjuicio que se ocasione sobre personas, bienes y/o personal de **CÁLIDDA** o de terceros que se produzca a causa de la ejecución de cualquier trabajo de cargo de **INVERMET** o sus contratistas comprendidos en el Proyecto.

b) Quejas de terceros, vecinos y/o propietarios de los predios ubicados o colindantes a la Zona de Influencia, que verse sobre cualquier aspecto relacionado a la ejecución del Proyecto y/o del Proyecto de Reubicación, siempre que dichas quejas no sean originadas en actos u omisiones atribuibles al personal o contratistas de **CÁLIDDA**.

13.6 **CÁLIDDA** no será responsable por los compromisos y obligaciones que **INVERMET** y/o sus contratistas y/o subcontratistas hayan asumido frente a terceros. De presentarse cualquier caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otro evento no imputable a **CÁLIDDA**, los plazos estipulados se prorrogarán por el periodo que tome superar las causas que motivaron la paralización del Proyecto.

13.7 **INVERMET** no será responsable de las contrataciones con terceros, proveedores o personal que efectúe **CÁLIDDA** para la ejecución del Convenio, no asumiendo ninguna responsabilidad laboral, civil o de otra naturaleza frente a terceros, siendo ésta asumida directamente por **CÁLIDDA** conforme a la normativa vigente.



## **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO**

14.1 **LAS PARTES** podrán resolver el presente Convenio, sin requerimiento de aviso previo, bastando, para tal efecto, una comunicación simple por escrito o por medio virtual, en caso sobrevengan las siguientes causales:

- a) Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por **LAS PARTES**. Para dicho efecto, la parte afectada remitirá una comunicación solicitando el cumplimiento de los compromisos asumidos, dando para ello un plazo máximo de quince (15) días calendario. En caso de persistir el incumplimiento o no levantarse las observaciones realizadas el Convenio podrá ser declarado resuelto de pleno derecho por la parte afectada. Tratándose del incumplimiento de la obligación prevista en el numeral 3 de la cláusula décima quinta o la cláusula décima sexta del Convenio **INVERMET** podrá declarar resuelto el Convenio de conformidad con lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil.
- b) Por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor, que impidan a **LAS PARTES** proseguir con el presente Convenio.
- c) Por mutuo acuerdo de **LAS PARTES**, el cual constara por escrito.

## **CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

15.1 Cualquier conflicto o controversia que se suscite respecto de la validez, interpretación, cumplimiento, anulación, nulidad, incumplimiento o cualquier otro concepto vinculado al presente Convenio deberá ser resuelto por las Partes mediante trato directo dentro de un plazo que no excederá de quince (15) días hábiles desde que una parte notifica a la otra de su intención de recurrir a esta Cláusula.

15.2 En el caso que vencido dicho plazo, según pueda ser prorrogado por las Partes mediante acuerdo escrito, subsista algún conflicto o controversia que fuera sometido a dicho trato directo, entonces cualquiera de las Partes podrá someter tal conflicto o controversia a arbitraje de derecho, a cargo de tres árbitros, correspondiendo a cada Parte nombrar a uno, y a los árbitros de cada Parte la designación del tercero. El arbitraje se llevará a cabo según lo previsto en el respectivo reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional de la Cámara de Comercio de Lima y/o Pontificia Universidad Católica del Perú, y el laudo que se expida será final y definitivo.

15.3 El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral instalado en la ciudad de Lima y el laudo arbitral emitido será vinculante para las partes y pondrá fin al proceso de manera definitiva, siendo el Laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. Los honorarios del Centro de Arbitraje y del Tribunal serán asumidos por las partes en aportes iguales.

## **CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

16.1 **INVERMET** se compromete a no ofrecer, ni a consentir y/o insinuar el ofrecimiento, a terceros, en especial a ningún servidor civil perteneciente a cualquier estamento de la administración pública y/o empresas públicas, miembro de las Fuerzas Armadas y/o de la Policía Nacional del Perú, candidato a Funcionario Público y/o partido político, directa o indirectamente, de ninguna donación, objeto

de valor, promesa, pago, auspicio, promesa o autorización de pago, remuneración, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier índole u objeto con algún valor pecuniario, ni a solicitar, comprometer o aceptar para sí mismo o para otros, directa o indirectamente, regalos, comisiones, dinero, dádivas, favores, sobornos o cualquier otro tipo de ventajas con el propósito de influenciar en terceros, en especial en un servidor civil y/o en un miembro de las Fuerzas Armadas y/o de la Policía Nacional del Perú, para lograr una ventaja inapropiada, sea que se trate de la realización, demora, agilización u omisión de cualquier acto, o algún negocio en beneficio propio y/o de **CÁLIDDA**, sea por acto propio y/o por su influencia, o actos que puedan ser considerados como una práctica ilegal o de corrupción a criterio de **CÁLIDDA** con relación a la ejecución del presente Contrato.

Esta obligación se hace extensiva a sus accionistas, directores, ejecutivos, empleados y/o toda persona que trabaje o preste algún tipo de servicio o que trabaje en su representación, incluyendo sin limitación alguna a sus subsidiarias, sucursales, afiliadas, subcontratistas, consultores, representantes e intermediarios.

Todo acto de esta naturaleza constituirá una causal de resolución inmediata y automática del presente convenio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que el incumplimiento de esta cláusula pudiera ocasionarle a **CÁLIDDA** o sus funcionarios y/o directivos, pudiendo dar lugar a las medidas correctivas aplicables de acuerdo a las políticas anticorrupción de **CÁLIDDA** y la normativa vigente.

- 16.2** Del mismo modo, **INVERMET** y **CÁLIDDA** se obligan expresamente a cumplir con todas las obligaciones y condicionantes en materia de prevención de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo que hayan quedado firmes ante las autoridades judiciales y a las exigencias de la Ley N° 30424 y el Decreto Legislativo N° 1352. Siendo ello así, **INVERMET** y **CÁLIDDA** deberán asegurar que todos sus empleados, proveedores y subcontratistas cumplan con dichas disposiciones legales, llevando a cabo todas las medidas necesarias y convenientes a fin de prevenir y evitar cualquier riesgo, peligro o incumplimiento en dichas materias.
- 16.3** En este sentido, las Partes convienen en que **CÁLIDDA** podrá, en cualquier momento, indagar, investigar, inquirir, auditar, solicitar cualquier documento y de cualquier forma comprobar sin restricción alguna, el estricto cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Contrato y en especial sobre lo estipulado en este numeral, obligándose **INVERMET** a facilitar a **CÁLIDDA** toda la información y documentación pertinente que le sea requerida, así como permitir la realización de dicha investigación cuando **CÁLIDDA** lo considere necesario. Igualmente, **INVERMET** se compromete a entregar esta información al Gobierno del Perú, incluyendo a cualquier autoridad, sea administrativa, judicial o local, o a cualquier otra persona que **CÁLIDDA** y/o sus accionistas le indique o determine que puede acceder a esta información.
- 16.4** **CÁLIDDA** se encuentra comprometida con una política de cero tolerancias frente al fraude y la corrupción, para lo cual promueve una cultura contra este tipo de conductas y mantiene el más alto nivel de aplicación de estándares profesionales y lineamientos éticos en su forma de operar y realizar negocios.
- 16.5** Por dicho motivo, se adjunta al presente Convenio, el Código de Ética de **CÁLIDDA**, como Anexo 03, el mismo que **INVERMET** declara conocer y se compromete a cumplir y respetar. Asimismo, **INVERMET** se obliga a difundir, el Código de Ética de **CÁLIDDA** entre su personal asignado a la ejecución del

Servicio, así como a sus empresas subcontratistas, para su conocimiento y cumplimiento bajo responsabilidad del Contratista.

- 16.6 INVERMET y CÁLIDDA** acuerdan que **CÁLIDDA** está facultada, siempre que considere necesario, a contar con la asistencia de auditores externos para que pueda auditar los libros, registros, cuentas y documentación de manera que se verifique el cumplimiento con las obligaciones descritas; siendo que **INVERMET** y **CÁLIDDA** se comprometen a cooperar plenamente con cualquier auditoría o solicitud de documentos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: PROHIBICION DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL CONVENIO**

**LAS PARTES** están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente Convenio, salvo expreso consentimiento de las partes, la cual deberá constar por escrito.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

- 18.1 INVERMET** podrá dar tratamiento a los datos personales de **CALIDDA**, únicamente con la finalidad de cumplir con el objeto del presente Acuerdo.
- 18.2 INVERMET** se obliga a mantener confidencialidad respecto a los datos personales que son materia del tratamiento aun después de finalizada la presente relación contractual, salvo cuando medie consentimiento expreso del titular de datos personales o demás causales previstas en la Ley N° 29733 o normas complementarias.
- 18.3** Asimismo, **INVERMET** se compromete a cumplir todas las disposiciones y a adoptar todas las medidas de seguridad contempladas en la Ley N° 29733 y normas complementarias para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en dicho marco normativo.
- 18.4** En caso se subcontrate la totalidad o parte del objeto del presente Acuerdo, los subcontratistas o terceros deberán cumplir las disposiciones y medidas de la Ley N° 29733, así como tratarlos datos personales con la misma finalidad para la que fueron transferidos y mantener la confidencialidad de los mismos.
- 18.5 CALIDDA** se encuentra facultado para verificar el cumplimiento de la totalidad de las medidas de seguridad a las que **INVERMET** se ha comprometido a adoptar en concordancia con la Ley N° 29733 y normas complementarias.
- 18.6** En caso, **CALIDDA** autorice a **INVERMET** a transferir dentro o fuera del territorio nacional los datos personales que han sido encargados, **INVERMET** se compromete a cumplir con todas las condiciones referentes a transferencia de datos establecidas en la Ley N° 29733 y normas de la materia.
- 18.7 CALIDDA** ha informado previamente al titular de los datos personales del tratamiento de sus datos y que cuenta con su autorización para proveer o haber provisto a **INVERMET** los datos personales relacionados con la prestación del servicio objeto del Acuerdo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO DE LAS PARTES**

19.1 Para los efectos del presente Convenio **LAS PARTES** señalan como su domicilio legal los consignados en la parte introductoria del Convenio, donde deben efectuarse todas las notificaciones que se generen de la ejecución del presente Convenio.

19.2 Se tendrán por válidamente variados los domicilios señalados en la parte introductoria del presente Convenio cuando esta decisión haya sido comunicada por vía notarial a la otra parte con una antelación de cinco (05) días hábiles.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPOSICIONES FINALES**

20.1 En todo lo que no se encuentre previsto en el presente Acuerdo, será de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

20.2 Queda estipulado que ninguna de **LAS PARTES**, ni los funcionarios encargados de ejecutar este Acuerdo, podrán realizar modificaciones mediante acuerdos verbales.

20.3 **LAS PARTES** declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas de este documento y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las reglas de la buena fe y común intención.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: RELACIÓN DE ANEXOS**

Forman parte integrante del presente Acuerdo, los siguientes:

Anexo N° 01: Presupuesto de la obra contenido en la Carta N° 2022-104949

Anexo N° 02: Cronograma de ejecución de obra

Anexo N° 03: Código de ética

En señal de conformidad con los términos del presente Convenio, **LAS PARTES** lo firman en dos (02) ejemplares originales de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los 29 días del mes de abril de 2022.

---

**HÉCTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO**  
Gerente de Proyectos  
Fondo Metropolitano de Inversiones –  
INVERMET

---

**EDWIN ALEXANDER VEGAS TORRES**  
Director de Operaciones

**ANEXO N° 11**  
**PRESUPUESTO**



**PRESUPUESTO REUBICACIÓN**

NOMBRE DE LA OBRA: R-21-018 \_REUBICACIÓN Av VICTOR RAUL HAYA DE LA TORF Rev: C

UBICACIÓN: AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - SMP

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Total
1.00	Ingeniería y Supervisión			S/ 32,858.59
2.00	Prensados sobre la tubería de PE en operación			S/ 3,741.91
3.00	Instalación de Tubería de PE Definitiva 63 mm a ser REUBICADA			S/ 31,410.90
4.00	Reubicación de TC			S/ 11,863.50
5.00	Empalme en caliente			S/ 7,542.08
6.00	Plan de Abandono de gasoducto			S/ 934.50
7.00	Retiro de producto de redes			S/ 943.65
8.00	Retiro de Tubería de PE (transporte de tubería despiece, desecho)			S/ 16,901.10
9.00	Implementación de lineamientos para prevención y control COVID 19			S/ 6,150.34
10.00	Actividades complementarias			S/ 85,797.07
10.01	Vigilancia técnica PPD = 1 técnico gas natural horario: Lunes a Sábado 08:00 hasta 17:00 horas no incluye Domingos ni feriados	dia	60	
10.02	Cinta de Seguridad	ML	2798	
10.03	Nivelación de Válvula PE	und	1	
10.04	Bioseguridad COVID 19	mes	2	
<b>SUB TOTAL S/.</b>				<b>S/ 198,143.64</b>
<b>IGV</b>				<b>S/ 35,665.86</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO (INC. IGV) S/.</b>				<b>S/ 233,809.50</b>

**IMPORTE A CONSIDERAR**


\* Las redes PE 63 mm deberán reubicarse de acuerdo a la geometría del diseño, en calzada o vereda. Existe un tramo de PE63 mm que se va profundizar por el corte de Terreno.

<sup>1</sup> Revisado y aprobado por la Gerencia de Proyectos de Invermet

**ANEXO N° 2<sup>2</sup>**  
**CRONOGRAMA DE OBRA**

**CRONOGRAMA DE OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: R-21-018 REUBICACIÓN Av. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - SMP  
UBICACIÓN: SAN MARTIN DE PORRES  
REV.: C

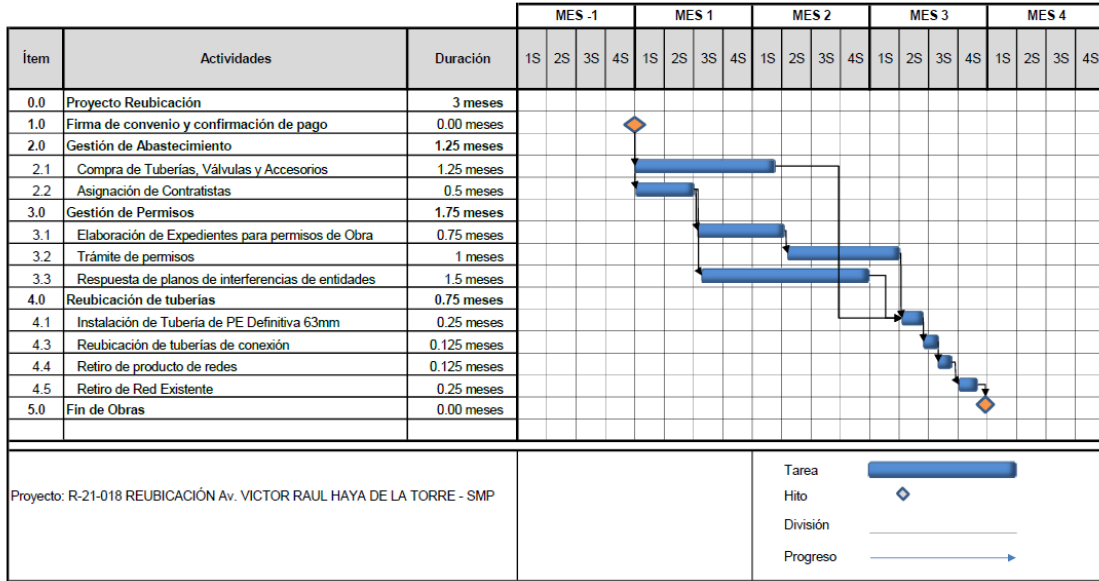

<sup>2</sup> Revisado y aprobado por la Gerencia de Proyectos de Invermet
